

**ПАСПОРТ**  
**готовности к отопительному периоду 2021/2022г.**

Выдан  
22.07. 2021г.

ООО "МИР "

в отношении объекта дом № 19 по ул. Парковой, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022г.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от 13.07.2021 N б/н

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022г:**

**Состав комиссии**


Гайдаров Андрей Павлович      Директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа, Председатель комиссии

Китрова Татьяна Владимировна      Ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа, секретарь комиссии.

**Члены комиссии:**

Лисовиченко Ирина Ивановна      Исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа.

Громова Ольга Петровна      Генеральный директор управляющей организации ООО "МИР".

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# АКТ

## промывки и гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения МКД № 19 по ул. Парковой к отопительному периоду 2021-2022гг.

г. Корсаков

« 13 » 04 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник АДС МУП «Тепло» М.П. Лашин, мастер ООО «МИР» Р. С. Эм, инспектор ООО «МИР» О.В. Визгалина составили настоящий акт о том, что произведена промывка и опрессовка системы отопления многоквартирного жилого дома

При промывке системы отопления выполнены следующие работы:

1. Система отопления промыта водой в 3-х кратном объеме; давление доведено питательным насосом до 6 кгс\кв. см. по контрольному манометру и падения его в течение 10 минут не наблюдалось.
2. При осмотре системы и оборудования теплового пункта под давлением видимых разрывов, подтеков не обнаружено.

### Заключение:

Система отопления МКД № 19, расположенного по адресу: г. Корсаков, ул. Парковая выдержала проведенное гидравлическое испытание, удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021-2022 гг.


Подписи:

Начальник АДС МУП «Тепло» \_\_\_\_\_ М.П. Лашин

Мастер ООО «МИР» \_\_\_\_\_ Р.С. Эм

Инспектор ООО «МИР» \_\_\_\_\_ В.В.Визгалина

Представитель совета дома \_\_\_\_\_

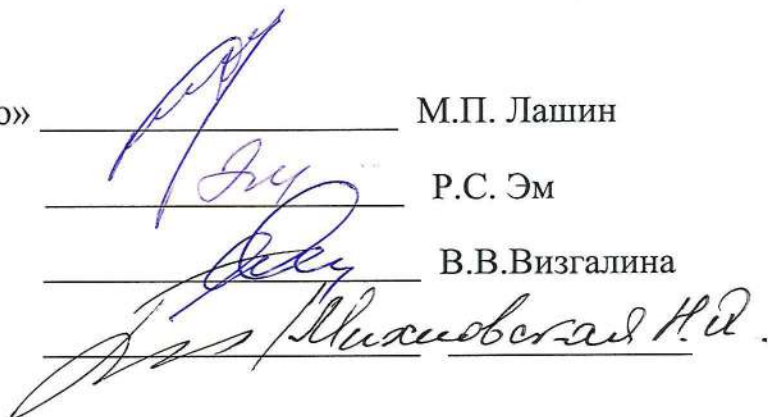

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «МИР»

О.П. Громова



## АКТ

Проверки готовности многоквартирного дома № 19, по ул. Парковой к отопительному периоду 2021-2022гг.

г. Корсаков

«13 04» 2021 г

Комиссия в составе:

Мастера ООО «МИР» Р.С.Эм инспектора ООО «МИР» О.В.Визгалина произвела проверку готовности многоквартирного дома по адресу: г. Корсаков, ул. Парковая, 19 к отопительному сезону 2021-2022 гг.

Результаты испытаний и осмотра:

1. Выполнение плана ремонтных работ систем теплоснабжения: *выполнено;*

№ кв, подвал	Наименование работ	Дата выполнения
Кв.2,5,8,11,14	Ремонт системы теплоснабжения	09.02.21
<i>46, 52, 55, 58</i>	<i>Ремонт системы теплоснабж.</i>	<i>18.02.2021г.</i>

Качество: *удовлетворительное;*

2. Утепление зданий: *чердаки и подвалы закрыты, лестничные клетки остеклены, входные двери исправны ;*
3. Изоляция трубопроводов, арматуры и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов: *присутствует.*
4. Состояние тепловых сетей трубопроводов, арматуры : *пригодно для эксплуатации в отопительный период;*
5. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией: *Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализации нет;*
6. Испытание на прочность и плотность трубопроводов, оборудования тепловых пунктов, теплопотребляющих установок: *проведено испытание, утечек не обнаружено;*
7. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами:

Гидравлическое испытание и промывка системы отопления проводилось силами ООО «МИР» (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

8. Наличие документов:

акт гидравлического испытания от 13.07.21 года

паспорт ОДПУ ВКТ-7 139556 \_\_\_\_\_

акт поверки ОДПУ и автоматических регуляторов: 02.10.2018.

---

Заключение:

Система отопления МКД, расположенного по адресу: г. Корсаков, ул. Парковая, 19 удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022

Мастер ООО «МИР»



Р.С.Эм

Инспектор ООО «МИР»



О.В. Визгалина

Представитель собственников

